



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset  
4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|              |                              |            |                                        |
|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Tarkastaja   | Simo Schuvalow               | Kiinteistö | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Osallistujat |                              | Rakennus   | Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas |
| Lomakepohja  | KTE SÄ Keskustarkastuslomake | Osoite     | Vanha Porvoontie 229                   |

| Kohta                                                                            | Tulos          | Lisätieto                                                                                                                                    | Vastaus kommenttiin                                                    | Liitteet                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPK D119.1                                                                       |                |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | Varasulakkeiden lisäys 63A/000.                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| TPK D020.1                                                                       |                |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Huomautettavaa |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                        |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | 12F teipattu Ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 16F , 18F, 26F, 28F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys. | Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille 3kpl. | 2 kpl<br>17605207531307<br>97934632572839<br>9159.jpg,<br>17605208525294<br>19684190950699<br>4181.jpg |



# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

## 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                          |  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                          |  |                                                      |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                          |  |                                                      |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| <b>TPK D115.1</b>                                                                |                |                                                                          |  |                                                      |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.                                   |  |                                                      |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?  | Huomautettavaa | Ylätiiviste aukkoja kaapeliläpiviennissä, tiivistysmassaa.               |  |                                                      |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | Puuttuvat kaapeltaskut ja merkinnät lisättävä lähteille ryhmä johdoille. |  | 1 kpl<br>17605193560655<br>07356888108932<br>953.jpg |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                          |  |                                                      |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                          |  |                                                      |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| <b>TPK D216.1</b>                                                                |                |                                                                          |  |                                                      |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?  | Kunnossa       |                                                                          |  |                                                      |

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | 4F, 21F,22F, 35F johdonsuoja teipattu/lukittu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut +merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta. 28F, 29F lähdöt ei ole käytössä, merkinnät korjattava. |  | 3 kpl<br>17605134577578<br>03568961656003<br>9423.jpg,<br>17605134798904<br>14076576631335<br>0381.jpg,<br>17605135040863<br>95039450416775<br>3901.jpg |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| <b>TPK D117.1</b>                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | 63A/000 varasulakkeiden lisäys.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohdoille. 21F on otettu käyttöön, päivitettävä pääkaavioon.                                                                                                                                                                                                            |  | 1 kpl<br>17605198989831<br>22900208005401<br>5649.jpg                                                                                                   |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Huomautettavaa | 12F0 VVS on teipattu ala-asentoon, kaapeli kytkettynä, selvitys.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                         |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |



# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

## 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                                                                                         |  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| <b>TPK F08.0 (kompressorihuone kellari)</b>                                      |                |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varasulakkeita lisättävä 25A tulppia 5kpl, 50A/000 3kpl. ja 80A/000 3kpl.</i>                                                        |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?  | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | <i>17F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys, esim, tulppasulakkeiden numerointi puutteellinen.</i> |  | 1 kpl<br>17605992750831<br>05325134632387<br>1297.jpg |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| <i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>                                         | Ei arvioida    |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| <b>TPK A018.1</b>                                                                |                |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.</i>                                                                                           |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?  | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| <i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>                                         | Ei arvioida    |                                                                                                                                         |  |                                                       |
| <i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>                            | Ei arvioida    |                                                                                                                                         |  |                                                       |



# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

## 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

### TPK A023.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varasulakkeita lisättävä  
63A/000 3kpl. Varoituskyltit  
ja lukituslaitteet puuttuu.  
Kuvakansio revennyt,  
uusittava.*

1 kpl  
17605077290805  
70681938798676  
6140.jpg

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*9F, 10F on otettu käyttöön,  
päivittämättä pääkaavioon,  
kaapelitasku +merkintä  
puuttuu.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

### TPK 1-6 (HEAVY KKP)

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kunnossa

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

### 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | <i>TPK5 5F pistorasialähdön rinnalle lisätty ryhmäjohto jonka lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys ja kuvapäivitys pääkaavioon sekä kaapelitaskun ja merkin lisäys. TPK2 lisätty ryhmäjohtoja keskuksen pistorasiaryhmien rinnalle, selvitys mitä syöttää ja päivitys pääkaavioon sekä kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys.</i> |  |                                                       |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Huomautettavaa | <i>TPK2 irtoliittimiä, korjaus vaatii ryhmän katkon.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1 kpl<br>17605063386734<br>38023005600765<br>8485.jpg |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| <b>TPK B020.1</b>                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?  | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | <i>10F0 VVS on "ohitettu" teippi merkintä (varmistettava), muutos päivitettävä pääkaavioon.</i>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B017.1**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja  
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kunnossa

*Keskuksen kaikki lähdöt  
käytössä.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

*1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet*

Ei arvioida

*1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät*

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B07.2.1**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja  
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*14F, 15F 16F on otettu  
käyttöön, lähtötietoja ei ole  
saatavilla, selvitys.  
Puuttuvien kaapelitaskujen  
ja merkintöjen lisäys  
ryhmäjohtoille.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

*1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet*

Ei arvioida

*1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät*

Ei arvioida

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                   |                |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                  | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <b>TPK B07.1.1</b>                                                                |                |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?     | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu</i>                                                                                     |                                                                          |  |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                             | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?   | Kunnossa       | <i>Alatiiviste aukkoja kaapeliläpiviennissä, tiivistysmassaa.</i>                                                                    |                                                                          |  |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                          | Huomautettavaa | <i>8F, 9F, 22F kaapeli purettu, päivittämättä pääkaavioon.</i>                                                                       |                                                                          |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                        | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                              | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>                                          | Ei arvioida    |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>                             | Ei arvioida    |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                  | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <b>TPK B07.1.2</b>                                                                |                |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?     | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu</i>                                                                                     |                                                                          |  |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                             | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?   | Huomautettavaa | <i>Alatiiviste aukkoja kaapeliläpivienissä.</i>                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                          | Huomautettavaa | <i>11F. On poistettu käytöstä, päivittämättä pääkaavioon. 20F, 21F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.</i> | <i>Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.</i> |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                        | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                              | Kunnossa       |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>                                          | Ei arvioida    |                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| <i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>                             | Ei arvioida    |                                                                                                                                      |                                                                          |  |

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B07.2.2**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja  
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

*Keskuksen yläpuolella,  
oikealla, irta jakorasia ja irta  
pistorasia.*1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kunnossa

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

*1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet*

Ei arvioida

*1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät*

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B07.2.3**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Liimattavan Piirustustaskun  
lisäys kansiluukun  
sisäpuolelle.*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*Keskuksen pääkytkin Off-  
asennossa, kaikki lähdöt on  
purettu.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

*1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet*

Ei arvioida

*1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät*

Ei arvioida

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B07.2.5**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja  
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Huomautettavaa

*Alatiiviteaukkoja,  
tiivistysmassaa.*

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*12F, 13F, 14F on otettu  
käyttöön, lähtötietoja ei ole  
saatavilla, selvitys.  
Kaapelitaskujen ja  
merkintöjen lisäys  
ryhmäjohtoille.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Huomautettavaa

*9F kaapeli kuorittu liian  
lyhyeksi, korjattava.*1 kpl  
17604406546542  
61508387690850  
1304.jpg

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

*1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet*

Ei arvioida

*1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät*

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000  
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

**TPK B07.2.4**1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,  
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet,  
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja  
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko  
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*12F, 13F on otettu käyttöön,  
lähtötietoja ei ole saatavilla,  
päivittämättä pääkaavioon.,  
selvitys.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa



# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

## 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                |  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                              | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                 | Ei arvioida    |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                    | Ei arvioida    |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                  | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| <b>TPK B07.2.6</b>                                                                |                |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?     | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | Lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu                                                                                                      |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?   | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                          | Huomautettavaa | 14F, 15F, 16F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla. Selvitys. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille. . |  |                                                       |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                        | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                              | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                 | Ei arvioida    |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                    | Ei arvioida    |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                  | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| <b>TPK B07.2.7</b>                                                                |                |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?     | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                             | Huomautettavaa | Keskuksen yläpuolella kaksi irtojakorasiala, kiinnitettävä.                                                                                    |  | 1 kpl<br>17604391117892<br>24874676010906<br>8396.jpg |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?   | Kunnossa       |                                                                                                                                                |  |                                                       |



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

### 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | 6F, 11F, 13F lukittu, kaapeli kytketty, kyltti puuttuu, lähtötietoja ei saatavilla, selvitys. 5F, 11F lukittu, kaapeli kytketty, mikä kentänpään tilanne? 14F ja 15F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille. |  |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>TPK B07.1.3</b>                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | 13F. 26F, 27F, 28F On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.                                                                                                                                                        |  |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**TPK D218.1**

|                                                                                  |                |                                                                                                     |  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Sulakemerkintöjen päivitys, lukituslaitteet puuttuu.</i>                                         |  |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Huomautettavaa | <i>Keskuksen oikealla puolella irtonainen turvakytin, kiinnitettävä. (Kone Granes).</i>             |  | 1 kpl<br>17605144601083<br>59678441404037<br>6123.jpg |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitu luokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | <i>Sulakemerkintöjen päivitys. 16F johdonsuojaa automaatti teipattu ala-asentoon, mikä tilanne?</i> |  | 1 kpl<br>17605142620092<br>62255805462688<br>3725.jpg |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                     |  |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                     |  |                                                       |

**TPK C018.1**

|                                                                                  |                |                                                                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                  |  |  |
| 1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | <i>Varasulakkeiden lisäys 63A/000.</i>                                                                                           |  |  |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                  |  |  |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitu luokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                  |  |  |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | <i>42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille 1kpl.</i> |  |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                  |  |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                  |  |  |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                  |  |  |



# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

## 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| <b>TPK C121.1</b>                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | Piirustasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.                                                                                          |                                                                   |                                                       |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Huomautettavaa | Ylätiiviste aukkoja kaapeliläpiviennissä, tiivistysmassaa.                                                                                       |                                                                   |                                                       |
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                                         | Huomautettavaa | Kuva puuttuu (löytyykö tiedostoista?) Keskusmerkinnät päivitettävä, lähtötiedot selvitys. 2F, 3F, 11F, 13F teipattu ala-asentoon , mikä tilanne? | Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille. | 1 kpl<br>17605213764574<br>25912236965825<br>3311.jpg |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                                       | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                                             | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki                 | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| <b>TPK L08.2 (labra)</b>                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?    | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit | Huomautettavaa | Piirustussalkku revennyt, uusittava.                                                                                                             |                                                                   | 1 kpl<br>17605254938635<br>47964166635910<br>2446.jpg |
| 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset                            | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |
| 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit? | Kunnossa       |                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       |



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

### 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

|                                                                  |                |                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät                         | Huomautettavaa | <i>Sulakelähtömerkintöjen päivitys. (2F, 3F, 13F, 29F, 30F on otettu käyttöön lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys KUVAPROJEKTI).</i> |  |  |
| 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet                       | Kunnossa       |                                                                                                                                           |  |  |
| 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet                             | Kunnossa       |                                                                                                                                           |  |  |
| 1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet                                | Ei arvioida    |                                                                                                                                           |  |  |
| 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät                   | Ei arvioida    |                                                                                                                                           |  |  |
| 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki | Kunnossa       |                                                                                                                                           |  |  |
| <b>MUUT</b>                                                      |                |                                                                                                                                           |  |  |
| 2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset  | Kunnossa       |                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                  |                |                                                                                                                                           |  |  |

# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4


Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

## Liitteet (16 kpl)

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** 12F teipattu Ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 16F , 18F, 26F, 28F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.

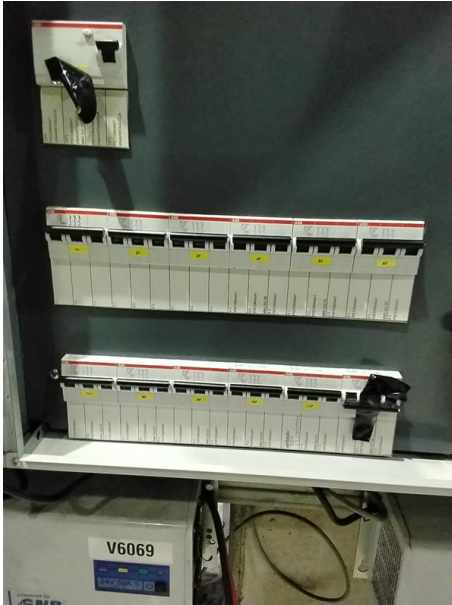

17605207531307979346325728399159.jpg

# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08



17605208525294196841909506994181.jpg


## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** *Puuttuvat kaapeltaskut ja merkinnät lisättävä lähteille ryhmäjohtoille.*

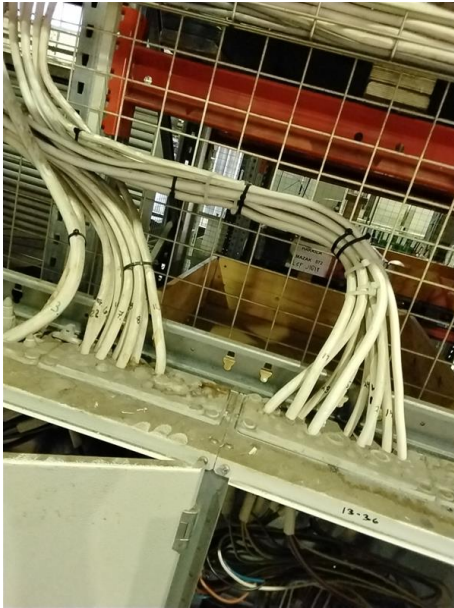

1760519356065507356888108932953.jpg


# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** 4F, 21F, 22F, 35F johdonsuoja teipattu/lukittu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut+merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta. 28F, 29F lähdöt ei ole käytössä, merkinnät korjattava.

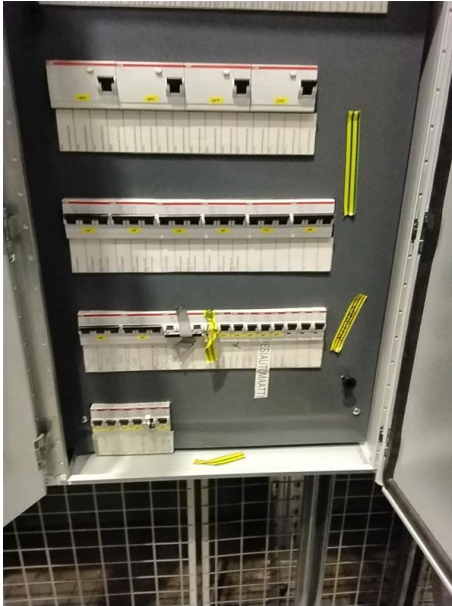


17605134577578035689616560039423.jpg


## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

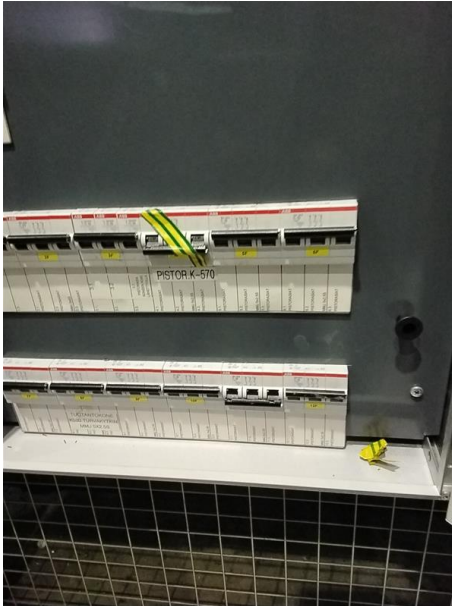

17605134798904140765766313350381.jpg

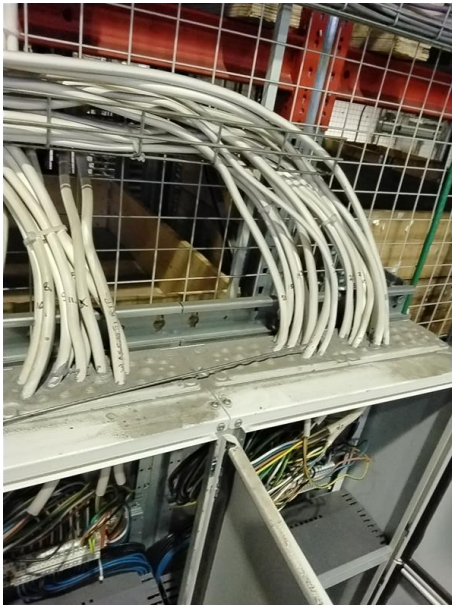

17605135040863950394504167753901.jpg


## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** *Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille. 21F on otettu käyttöön, päivitettävä pääkaavioon.*

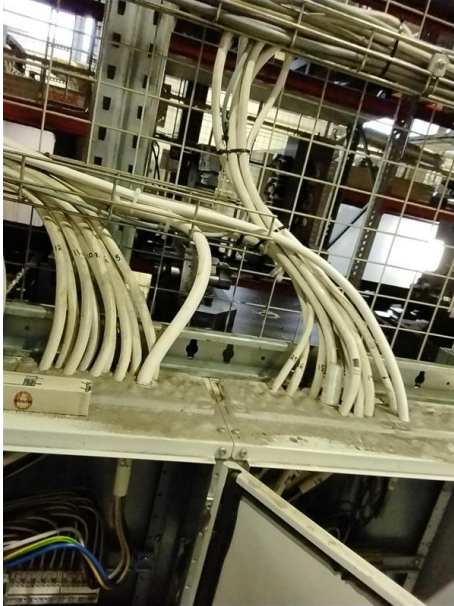

17605198989831229002080054015649.jpg



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** 17F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys, esim, tulppasulakkeiden numerointi puutteellinen.



17605992750831053251346323871297.jpg

# KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

**Kuvaus** Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl. Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu. Kuvakansio revennyt, uusittava.



17605077290805706819387986766140.jpg

## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

**Kuvaus** TPK2 irtoliittimiä, korjaus vaatii ryhmän katkon.



17605063386734380230056007658485.jpg



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

**Kuvaus** 9F kaapeli kuorittu liian lyhyeksi, korjattava.



17604406546542615083876908501304.jpg



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

**Kuvaus** Keskukseen yläpuolella kaksi irtojakorasiaa, kiinnitettävä.



17604391117892248746760109068396.jpg

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**  
**4/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset**Kuvaus** Keskuksen oikealla puolella irtonainen turvakytkin, kiinnitettävä. (Kone Granes).

17605144601083596784414040376123.jpg



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** Sulakemerkintöjen päivitys. 16F johdonsuojaautomaatti teipattu ala-asentoon, mikä tilanne?



17605142620092622558054626883725.jpg



## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

**Kuvaus** Kuva puuttuu (löytyykö tiedostoista?) Keskusmerkinnät päivitettävä, lähtötiedot selvitys. 2F, 3F, 11F, 13F teipattu ala-asentoon , mikä tilanne?



17605213764574259122369658253311.jpg


## KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 4/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:08

**Kohta** 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

**Kuvaus** *Piirustussalkku revennyt, uusittava.*

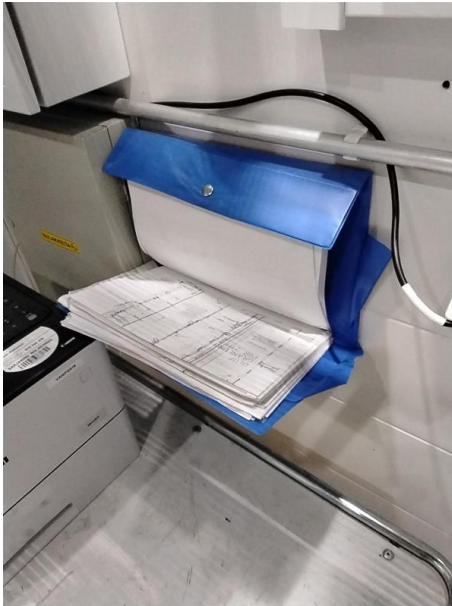

17605254938635479641666359102446.jpg
