



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
IKK B111.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	10A Tulppasulakkeita lisättävä 10kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKT D019.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Pääkaavio ja keskusmerkinnät päivitettävä. Kilpitylaus.	Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys syöttökaapeleihin.	1 kpl 17606852131077 78776347833352 2292.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	5F, 6F, 7F kaapeli kytkettynä, sulakkeet poistettu, kannessa dymomerkintä: ei saa kytkeä poistettu käytöstä, onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.		1 kpl 17606850390057 90894189967895 4200.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Huomautettavaa	9F löysä liitos kaapelikuilun maadoituskiskon liitoksessa, kiristetty sähköhuollon, ei jatkotoimenpiteitä.		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKK F08.0				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Johdonsuojien sulakemerkintöjen päivitys, automaattisulakkeissa käsin merkintöjä, merkintöjen korjaus koneella tehdyksi. Kytkinvarokelähtöjen päivitys, kaiveruskilpien tilaus 9 kilpeä.	Pääkaavionpäivitys mm. 73F, 73F on otettu käyttöön, puuttuvat kaapelitaskut ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille.	4 kpl 17606064881614 64314910934353 5885.jpg, 17606065768051 28063225628524 7310.jpg, 17606066703112 13299465578048 2384.jpg, 17606073235307 66858258089099 3156.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa		Keskuksen verkkoanalysointin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen, mittari on alkuperäinen ja elinkaaren loppupuolella, suositellaan mittarin uusimista.	1 kpl 17606062254537 17698723529783 6459.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKT J051.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilussa nousukaapeleissa työaikaisia nippusidekiinnityksiä, lisättävä kaarikiinnikkeet 4kpl.		1 kpl 17606793513417 06678712506497 9120.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	22F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys. (Kuvaprojekti)		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	H2 merkkivalon sisäpuoleinen kosketussuoja puutteellinen, kalusteen liittimiensuojaosa puuttuu, led kontrollimerkkivalo uusittava.	Lähtö 02C (5F1-3) vääntökahvan lukitus ei estä avaamista luukkua ON-asennossa, vääntöakselin säätö, jos säätö ei auta kahva uusittava, akseli 12mm kahvan pituus 150mm ABB yhteensopiva.	2 kpl 17606798491378 06633949889403 5423.jpg, 17606803478435 13610604926469 5944.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKT C016.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Kaapelikuiluissa, kaapeleiden työaikaisten nippuside kiinnityksien vaihto kaari kiinnikkeiksi, n.45kpl.</i>		2 kpl 17606908474928 02800110896008 4179.jpg, 17606908887567 90215503125355 8429.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>5F sulakkeet poistettu, kahvassa roikkuva lukko ei lukitse kahvaa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne? 16F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, onko kentänpää turvallisesti? 18F lukittu Off asentoon, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?</i>	<i>Pääkaavion ja keskusmerkintöjen päivitys esim 8F kannessa teippimerkintä " vapaa", sulakkeet poistettu, johtimet irrotettu kytkentäliittimistä, johtopäätetty kennon sisälle jakorasialaan. Onko kentän päässä turvallisesti? (Kuvaprojekti).</i>	1 kpl 17606914432406 19511503002222 2915.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Verkkoanalysointin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysointin uusimista</i>		1 kpl 17606915111868 56199680440399 8687.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	8F lähdössä (kohdassa 1.5) Irtokaapelinpää kaapelikeneeseen päätetty jakorasiaan kennossa, turha kaapeli siirrettävä ja rasioitava keskuksen ulkopuolelle.		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Katkaisija huolto tehty 5/25 seuraava huolto 2028.		
IKK G5.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit puuttuu		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Hiipunut Led-kontrollimerkkivalo 41H1 uusittava.		1 kpl 17606151695851 83716265966251 1904.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKT D019.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, 80A/000 3kpl, 100A/000 3kpl, 25A/000 3kpl, 125A/000 3kpl. Sulakkeen vaihtokahva puuttuu.		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	15F lähtö lukittu, kahva Off asennossa, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä. Mikä tilanne? 21F kytkinvaroke OFF-asennossa, sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne? 22F kytkinvaroke OFF-asennossa, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024, katkaisija huollettu 5/2025 Insta seuraava katkaisijahuolto 2028.		
NKT A019.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä vastaamaan nykytilannetta, esim. 13F, 21F kaapeli purettu. 17F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?, selvitys. 42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 36F4 VVS on ohitettu, päivittämättä pääkaavioon, selvitys. Kilpitilaus.</i>		3 kpl 17606927448598 54790711356201 9553.jpg, 17606927687574 90331707405326 8237.jpg, 17606927906121 58421801477716 7442.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>07A ja 05D lähdöt lukittu riippulukolla 11 ja 12/2023 Off asentoon, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä? Selvitys.</i>	<i>21F N-liitin repeytynyt irti alustastaan, liittimen kiinnitys on vioittunut, liitin uusittava. PE-Liittimeen jätetty johtimenpää poistettava.</i>	1 kpl 17606934714492 46364143990776 3911.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		<i>Pääkatkaisija huollettu 5/2025 seuraava huolto 2028</i>	
IKK B118.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>10A tulppasulakkeita lisättävä 10kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Työaikaisen nippusidekiinnityksien poistaminen ja kaarikiinnikkeiden lisäys kaapelikuilun kaapeleihin.</i>		1 kpl 17606124486812 51112355106117 1357.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>P1 verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.</i>		1 kpl 17606126620813 58984414496540 1296.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
NKK G5.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varoituskyltit puuttuu</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö OP1 (ylempi) on pikselöitynyt, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.</i>		1 kpl 17606152607415 04002485307064 180.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	<i>IV-konehuoneen edessä, kaapeleiden kiinnitys on pettänyt useasta kohtaa, kaapelit roikkuvat. Kaapeleiden kiinnitys ennalleen säänkestävillä nippusiteillä sekä suojapellin asennus oviaukon kohdalle.</i>	.	1 kpl 17606155248196 62063946833448 9682.jpg
NKT B07.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			1 kpl 17606956780859 05078710190312 0903.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Sulakekaappi lojuu irrallaan lattialla kiinnitystilan puutteen vuoksi, sulakekaapin kiinnitys sopivaan paikkaan.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>17F on otettu käyttöön lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys (Kuvaprojekti).</i>	<i>Syöttävän keskuksen kilpilaus " Syöttö keskukselta PKT02" 1kpl.</i>	
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, verkkoanalysaattori on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.</i>		1 kpl 17606963361507 36109570074265 9126.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

IKK H8.0

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 20A/000 3kpl, 10A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Keskusmerkintöjen päivitys mm. Kilpituksen tekeminen lähdölle 3F,4F,5F ja nokkakytkimille 6F,8F,12F. Tulppasulakkeille 17F-30F puuttuvien sulakemerkintöjen lisäys.</i>		3 kpl 17606088641243 87407772630396 7877.jpg, 17606088848422 87878595677988 1479.jpg, 17606090064871 07641556970396 6473.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Keskuksen verkkoanalysoittorin näyttö on himmennyt osin lukukelvottomaksi, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysoittorin uusimista.</i>	<i>16H1 led-kontrollimerkkivalo palanut, uusittava.</i>	2 kpl 17606082699565 79664180534528 9729.jpg, 17606091913407 88479305575741 1191.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

NKT D225.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, 40A/000 3kpl, 35A/000 3kpl., 32A/000 3kpl, 50A/000 3kpl, 80A/000 3kpl.10A /000.</i>		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Kaapelikuilun kaapelien rakennusaikaiset nippusidekiinnitykset muutettava kaarikiinnikeiksi.</i>		1 kpl 17606817218528 37943102008723 4776.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Pääkaavion ja keskusmerkintöjen päivitys, kilpilaus. Kaksi pääkaaviota joista kumpikaan ei vastaa nykytilannetta, 8F sulakkeet poistettu, kahva Off asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne kentänpäässä? 9F lähtö käytössä, sulakkeet paikoillaan ja kaapeli kytkettynä, kannessa teippimerkintä "laite poistettu käytöstä" mikä tilanne? Kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.</i>	<i>Tämä keskus on kuvapäivitysprojekin ulkopuolelle jäänyt keskus, keskukselta ei silloin löytynyt dokumentteja.</i>	2 kpl 17606819487133 31856991841396 3374.jpg, 17606826153556 25781157030267 5951.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
IKK B14.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4**

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23


20.10.2025 8:06

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Kunnossa	Lämpökuvauus tehty 8/2024		

Liitteet (33 kpl)

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä vastaamaan nykytilannetta, esim. 13F, 21F kaapeli purettu. 17F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?, selvitys. 42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 36F4 VVS on ohitettu, päivittämättä pääkaavioon, selvitys. Kilpitilaus.*

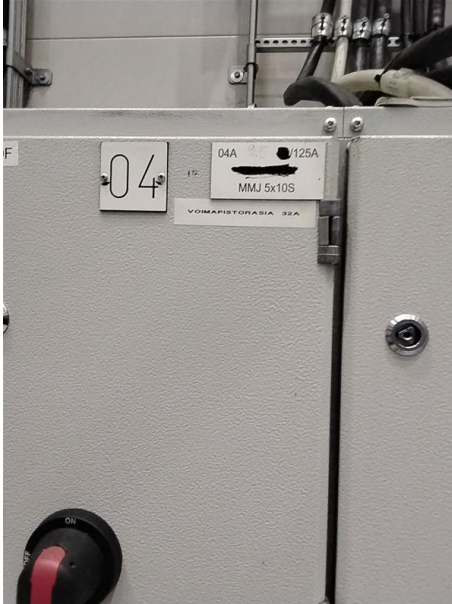


17606927906121584218014777167442.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

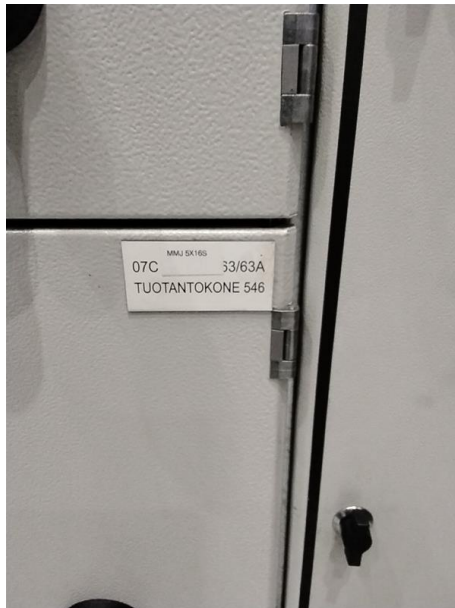

17606927448598547907113562019553.jpg



17606927687574903317074053268237.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 07A ja 05D lähdöt lukittu riippulukolla 11 ja 12/2023 Off asentoon, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä?
Selvitys.



17606934714492463641439907763911.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät


Kuvaus Johdonsuojien sulakemerkintöjen päivitys, automaattisulakkeissa käsin merkintöjä, merkintöjen korjaus koneella tehdyiksi. Kytkeinvarokelähtöjen päivitys, kaiverruskilpien tilaus 9 kilpeä.



17606065768051280632256285247310.jpg



17606066703112132994655780482384.jpg

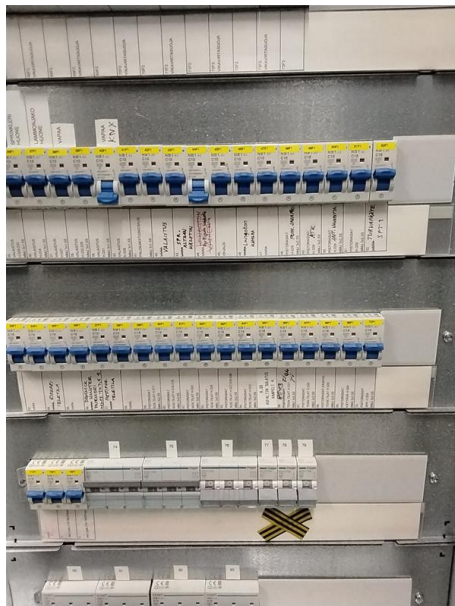

17606064881614643149109343535885.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

17606073235307668582580890993156.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus



17606062254537176987235297836459.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Keskusmerkintöjen päivitys mm. Kilpitilauksen tekeminen lähdölle 3F,4F,5F ja nokkakytkimille 6F,8F,12F. Tulppasulakkeille 17F-30F puuttuvien sulakemerkintöjen lisäys.



17606090064871076415569703966473.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

17606088641243874077726303967877.jpg



17606088848422878785956779881479.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus Keskukseen verkkoanalysaattorin näyttö on himmennyt osin lukukelvottomaksi, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.




17606082699565796641805345289729.jpg



17606091913407884793055757411191.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Kaapelikuilussa nousukaapeleissa työaikaisia nippusidekiinnityksiä, lisättävä kaarikiinnikkeet 4kpl.*

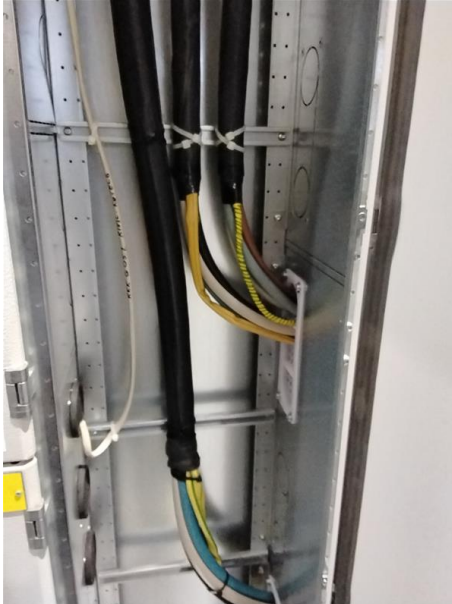

17606793513417066787125064979120.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23


20.10.2025 8:06

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *H2 merkkivalon sisäpuoleinen kosketussuoja puutteellinen, kalusteen liittimiensuojaosa puuttuu, led kontrollimerkkivalo uusittava.*

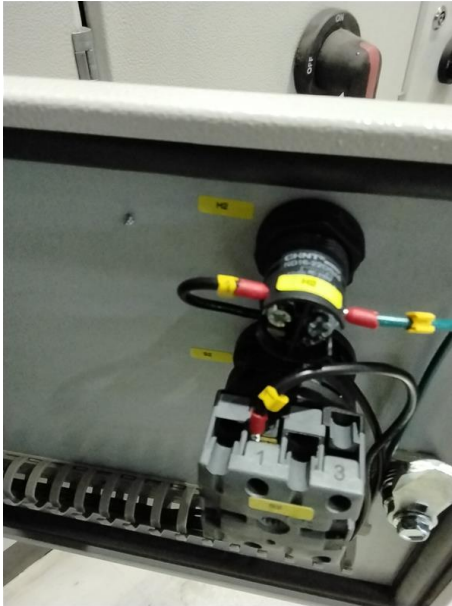

17606798491378066339498894035423.jpg

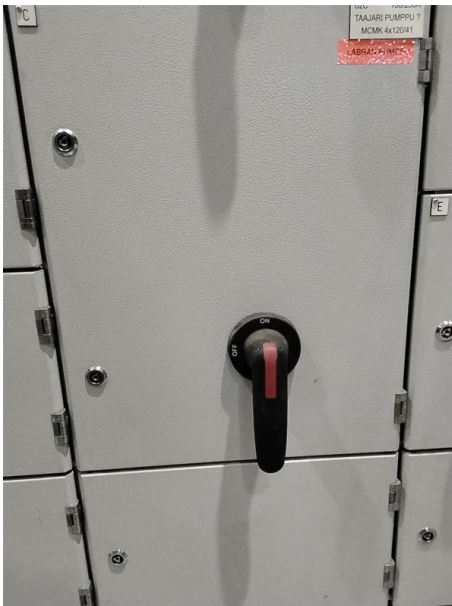

17606803478435136106049264695944.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Pääkaavio ja keskusmerkinnät päivitettävä. Kilpitilaus.*



17606852131077787763478333522292.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 5F, 6F, 7F kaapeli kytkettynä, sulakkeet poistettu, kannessa dymomerkintä: ei saa kytkeä poistettu käytöstä, onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.



17606850390057908941899678954200.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Työaikaisen nippusidekiinnityksien poistaminen ja kaarikiinnikkeiden lisäys kaapelikuilun kaapeleihin.*



17606124486812511123551061171357.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *P1 verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.*



17606126620813589844144965401296.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Hiipunut Led-kontrollimerkkivalo 41H1 uusittava.*



17606151695851837162659662511904.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö OP1 (ylempi) on pikselöitynyt, alkuperäinen laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.



1760615260741504002485307064180.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

Kohta 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki

Kuvaus *IV-konehuoneen edessä, kaapeleiden kiinnitys on pettänyt useasta kohtaa, kaapelit roikkuvat. Kaapeleiden kiinnitys ennalleen säänkestävillä nippusiteillä sekä suojapellin asennus oviaukon kohdalle.*



17606155248196620639468334489682.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus



17606956780859050787101903120903.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Keskuksen verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, verkkoanalysaattori on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista.*



17606963361507361095700742659126.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus Kaapelikuilun kaapelien rakennusaikaiset nippusidekiinnitykset muutettava kaarikiinnikeiksi.



17606817218528379431020087234776.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Pääkaavion ja keskusmerkintöjen päivitys, kilpitilaus. Kaksi pääkaaviota joista kumpikaan ei vastaa nykytilannetta, 8F sulakkeet poistettu, kahva Off asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne kentänpäässä? 9F lähtö käytössä, sulakkeet paikoillaan ja kaapeli kytkettynä, kannessa teippimerkintä "laite poistettu käytöstä" mikä tilanne? Kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille.*




17606819487133318569918413963374.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 2/4

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:15:23

20.10.2025 8:06

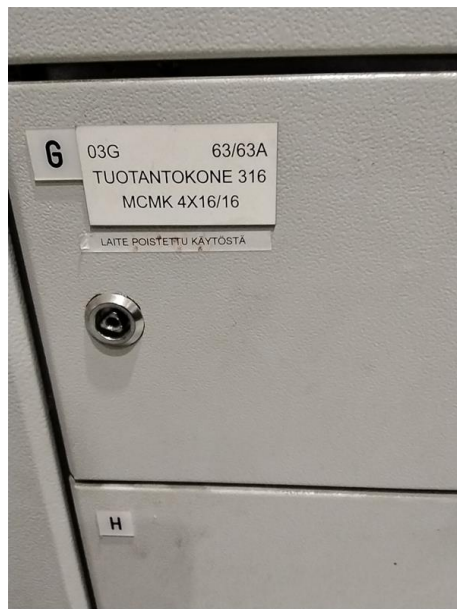

17606826153556257811570302675951.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Kaapelikuiluissa, kaapeleiden työaikaisten nippuside kiinnityksien vaihto kaarikiinnikkeiksi, n.45kpl.*




17606908474928028001108960084179.jpg



17606908887567902155031253558429.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *5F sulakkeet poistettu, kahvassa roikkuva lukko ei lukitse kahvaa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne? 16F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, onko kentänpää turvallistettu? 18F lukittu Off asentoon, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?*

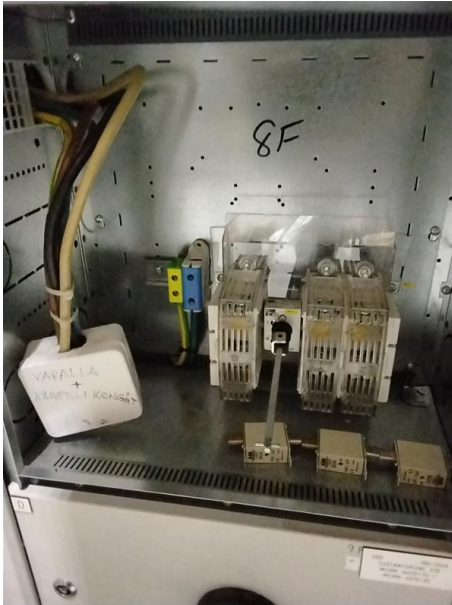

17606914432406195115030022222915.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta, laite on elinkaaren loppupäässä, suositellaan verkkoanalysaattorin uusimista*



17606915111868561996804403998687.jpg
