



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
NKT A019.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	06 ja 05 välisessä kaapelikuilussa irtonousukaapeli kaapelikenkineen, purettava keskuksesta ja rasioitava (vaatii nostimen), onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.		1 kpl 17229279448928 79548583557632 4080.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Kaapelikuilun ja kennon välinen kumisuoja pois paikoiltaan lähdössä 04B.		1 kpl 17229280999975 40589595940955 7646.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä vastaamaan nykytilannetta, esim. 13F, 21F kaapeli purettu. 17F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?, selvitys. 42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 36F4 VVS on ohitettu, päivittämättä pääkaavioon, selvitys.		2 kpl 17229287229456 99400403807783 4479.jpg, 17229288603808 75515036914627 1425.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	07A ja 05D lähdöt lukittu riippulukolla 11 ja 12/2023 Off asentoon, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä? Selvitys.		2 kpl 17229283625847 19359916125690 3930.jpg, 17229283956348 22151204360011 4194.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		Lämpökuvaus tehty 8/2024	
NKK F08.0				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Johdonsuojien sulakemerkintöjen päivitys, käsin merkintöjä.		1 kpl 17228551172482 68786148735009 0218.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	19K10 kela käy kuumana, maininta LK raportissa. 21H1 ja 26H1 kontrollimerkkivalot palaneet, uusittava.		1 kpl 17228554045828 97333873926559 7674.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024		
IKK H8.0				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita lisättävä 20A/000 3kpl, 10A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024		
NKT J051.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilussa nousukaapeleissa työaikaisia nippusidekiinnityksiä, lisättävä kaarikiinnikkeet 4kpl.		1 kpl 17228483571857 03664580219007 7474.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	22F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Lähtöjen 3F ja 4F N ja PE liittimiin on liitetty kaksi johdinta samaan liittimeen, liitin muutettava haaritusliittimeksi, vaatii sähkökatkon kyseisiin lähtöihin. H2 merkkivalon sisäpuoleinen kosketussuoja puutteellinen, led kontrollimerkkivalo uusittava.		3 kpl 17228486012993 55565366448475 080.jpg, 17228486367615 33568424913807 3773.jpg, 17228501450003 48753807118962 3392.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaukset tehty 8.2024		
NKT D019.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, 80A/000 3kpl, 100A/000 3kpl, 25A/000 3kpl, 125A/000 3kpl. Sulakkeen vaihtokahva.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Kennolähtöjen kilpiä päivitettävä, uudet aiemmin tilatut kilvet tilatut odottaa asennusta PKT01 tilan tarvikkeakaapissa. 15F lähtö lukittu, kahva Off asennossa, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä. Mikä tilanne?		1 kpl 17230094016496 02680371653619 8955.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	17F lähdön kytkinvarokkeen yläpuoleinen kosketussuoja puuttuu, rakennettava uusikosketussuoja polykarbonaattilevystä.		1 kpl 17230106126796 50444960919568 7902.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	Kaapelikuiluissa 2kpl irtonousukaapeleita, rasioitava keskuksen ulkopuolelle.		2 kpl 17230095927094 08283404938167 5119.jpg, 17230099470318 50331381577313 0377.jpg
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuSLaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024, katkaisija huollettu 11/2022 Insta seuraava katkaisijahuolto 2025.	Tiedoksi: Kuvaprojektin rev2 keskuksen ulkopuolisten kaapeleiden selvitystyö jäänyt kesken, useita ryhmiä ilman lähtötietoja.	
NKT D019.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Kuvasalkku, varoituskyltit puuttuu.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Kuvat puuttuu, keskusmerkinnät päivitettävä.		2 kpl 17229452274993 43848335140953 99.jpg, 17229452605583 29737173538502 2019.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	5F, 6F, 7F kaapeli kytkettynä, sulakkeet poistettu, kannessa dymomerkintä: ei saa kytkeä poistettu käytöstä, onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.		1 kpl 17229455651678 89112351314827 1158.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuSLaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024		
IKK B118.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	10A tulppasulakkeita lisättävä 10kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilun kaapeleihin lisättävä Kaarikiinnikkeet.		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Syöttävän keskuksen tunnuskilpi odottaa pkt01 kaapissa asennusta.</i>		1 kpl 17234566088966 33373852416393 0095.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Lämpökuvaus tehty 8/2024</i>		
IKK B14.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Syöttävän keskuksen kilpi odottaa asennusta PKT02 keskustilan kaapissa.</i>		1 kpl 17234624237827 98390376630820 0912.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Lämpökuvaus tehty 8/2024</i>		
IKK G5.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3**

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	28F poistettu käytöstä, kytkentäriviliitin tyhjä, sulakemerkintä ja pääkaavio päivitettävä, sulake ja pohja poistettava.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Hiipuneet/palaneet Led-kontrollimerkkivalot 58H1, 61H1, 63H1 ja 63H1 uusittava.		1 kpl 17235381862058 51632381393830 5257.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	5F-31F kytkentätilassa irtojohtimia, johtimien päättäminen.		1 kpl 17235401540272 38512638829881 1354.jpg
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024		
NKK G5.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvaus tehty 8/2024		
IKK B111.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3**

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	10A Tulppasulakkeita lisättävä 10kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Syöttävän keskuksen kilpi odottaa asennusta pkt02 keskustilan kaapissa.		1 kpl 17234594160417 11506304222960 0149.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvauus tehty 8/2024		
NKT B07.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskuksen päällipuoli rasvapölyinen, roiskeita, imurointi/pyyhintä esim. Powerwipes liinoilla.		1 kpl 17229223175385 20175792069276 9440.jpg
1.2 Sähkötötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Sulakekaappi lojuu irrallaan lattialla kiinnitystilan puutteen vuoksi, sulakekaapin kiinnitys sopivaan paikkaan.		1 kpl 17229217929227 74962404542614 3530.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilussa Irtonousukaapeli päät teipattuna, rasioitava keskuksen ulkopuolelle, onko toinen pää turvallistettu?		1 kpl 17229214443311 96609535336766 0671.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Ylätiiviste aukkoja.		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Esim. 4F lähdön kaapeli purettu, päivittämättä pääkaavioon.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	Kts.kohta 1.3		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvauus tehty 8/2024		
NKT D225.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakekaappi puuttuu, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, 40A/000 3kpl, 35A/000 3kpl., 32A/000 3kpl, 50A/000 3kpl, 80A/000 3kpl.10A tulppia 5kpl. Johdonsuojien lukituslaitteita ABB johdonsuojille.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilun kaapelien rakennusaikaiset nippusidekiinnitykset muutettava kaarikiinnikeiksi.		1 kpl 17230139094279 10383089986677 3962.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Kaksi pääkaaviota joista kumpikaan ei vastaa nykytilannetta, pääkaavio päivitys tehtävä.8F sulakkeet poistettu, kahva Off asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne kentänpäässä?		1 kpl 17230137347558 03836309755298 1383.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Lämpökuvauus tehty 8/2024		
NKT C016.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3**

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Kaapelikuiluissa, kaapeleiden työaikaisten nippuside kiinnityksien vaihto kaarikiinnikkeiksi, n.45kpl.</i>		1 kpl 17234410583501 97834199767503 9354.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>5F sulakkeet poistettu, kahvassa roikkuva lukko ei lukitse kahvaa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne? 16F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, onko kentänpää turvallistettu? 18F lukittu Off asentoon, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?</i>		3 kpl 17234418473213 18157408959426 5986.jpg, 17234418875422 50276722675142 6856.jpg, 17234424712555 90697383939871 6613.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Verkkoanalyysointinäyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta.</i>		1 kpl 17234429443414 50673112062713 1899.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	<i>Irtokaapelinpää kaapelikenkineen päätetty jakorasiaan kennossa, turha kaapeli siirrettävä ja rasioitava keskuksen ulkopuolelle.</i>		1 kpl 17234413575252 75037730859208 9749.jpg
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	<i>Lämpökuvaus tehty 8/2024. Katkaisija huolto tehty 11/22 seuraava huolto 2025.</i>		
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Kunnossa	<i>Lämpökuvaus tehty 8/2024</i>		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3


Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Liitteet (35 kpl)

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 07A ja 05D lähdöt lukittu riippulukolla 11 ja 12/2023 Off asentoon, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä?
Selvitys.

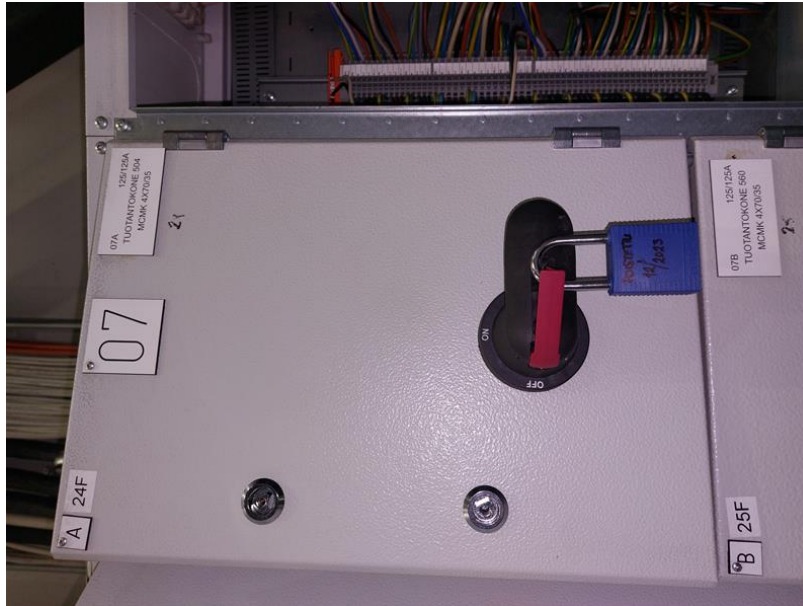

17229283625847193599161256903930.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26



17229283956348221512043600114194.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Pääkaavio ja sulakelähtömerkinnät päivitettävä vastaamaan nykytilannetta, esim. 13F, 21F kaapeli purettu. 17F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?, selvitys. 42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 36F4 VVS on ohitettu, päivittämättä pääkaavioon, selvitys.*



17229287229456994004038077834479.jpg



17229288603808755150369146271425.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus *Kaapelikuilun ja kennon välinen kumisuoja pois paikoiltaan lähdössä 04B.*

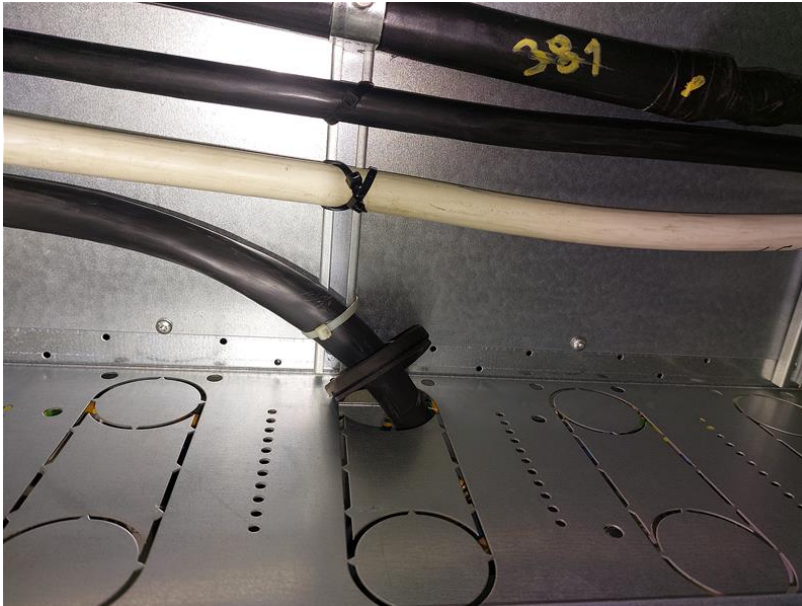

1722928099975405895959409557646.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus 06 ja 05 välisessä kaapelikuilussa irtonusukaapeli kaapelikenkineen, purettava keskuksesta ja rasioitava (vaatii nostimen), onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.



17229279448928795485835576324080.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 19K10 kela käy kuumana, maininta LK raportissa. 21H1 ja 26H1 kontrollimerkkivalot palaneet, uusittava.



17228554045828973338739265597674.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Johdonsuojien sulakemerkintöjen päivitys, käsin merkintöjä.



17228551172482687861487350090218.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Lähtöjen 3F ja 4F N ja PE liittimiin on liitetty kaksi johdinta samaan liittimeen, liitin muutettava haaroitusliittimeksi, vaatii sähkökatkon kyseisiin lähtöihin. H2 merkkivalon sisäpuoleinen kosketussuoja puutteellinen, led kontrollimerkkivalo uusittava.*




17228486367615335684249138073773.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

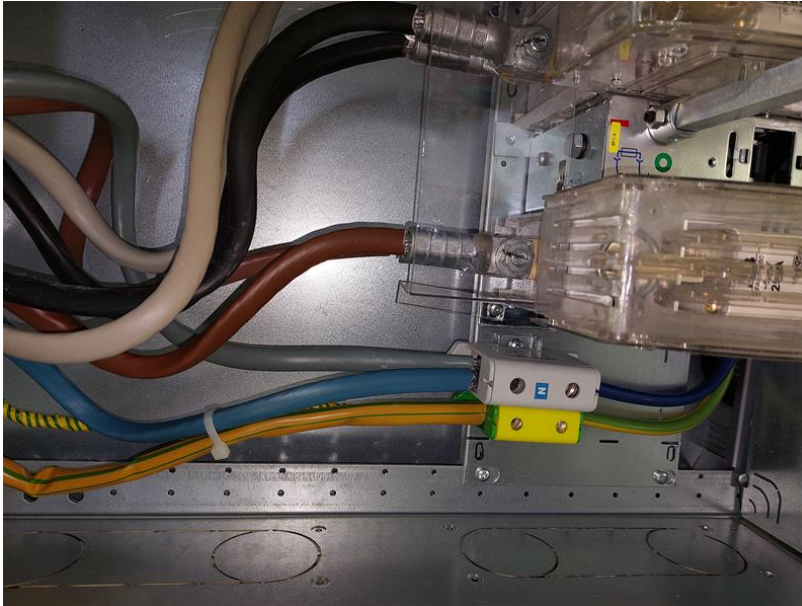

1722848601299355565366448475080.jpg

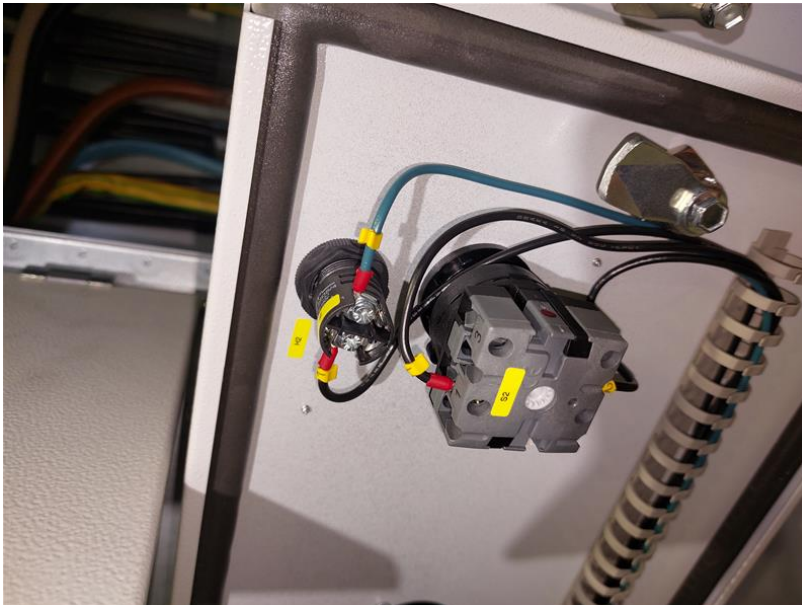

17228501450003487538071189623392.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset


Kuvaus Kaapelikuilussa nousukaapeleissa työaikaisia nippusidekiinnityksiä, lisättävä kaarikiinnikkeet 4kpl.



17228483571857036645802190077474.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 17F lähdön kytkinvarokkeen yläpuoleinen kosketussuoja puuttuu, rakennettava uusikosketussuoja polykarbonaattilevystä.

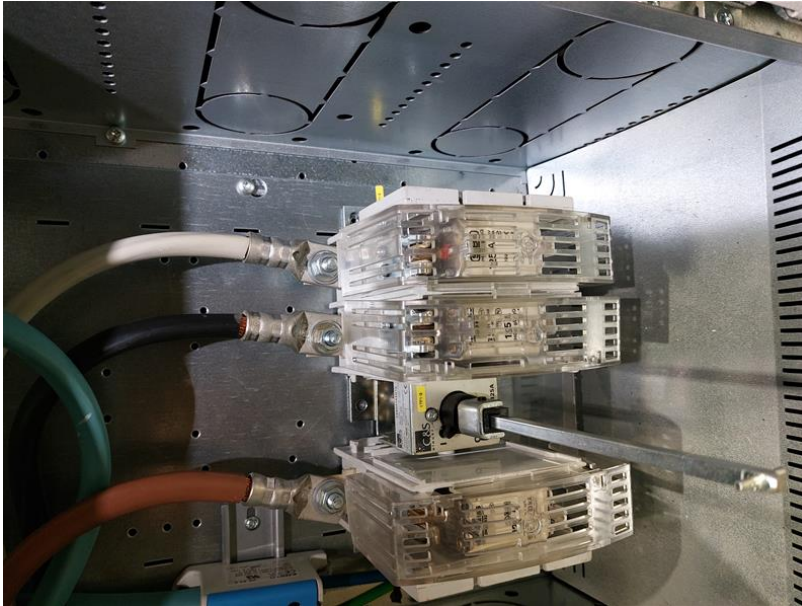

17230106126796504449609195687902.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät**Kuvaus** *Kennolähtöjen kilpiä päivitettävä, uudet aiemmin tilatut kilvet tilatut odottaa asennusta PKT01 tilan tarvikekaapissa. 15F lähtö lukittu, kahva Off asennossa, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä. Mikä tilanne?*


17230094016496026803716536198955.jpg

Kohta 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kuvaus Kaapelikuiluissa 2kpl irtonousukaapeleita, rasioitava keskuksen ulkopuolelle.



17230095927094082834049381675119.jpg

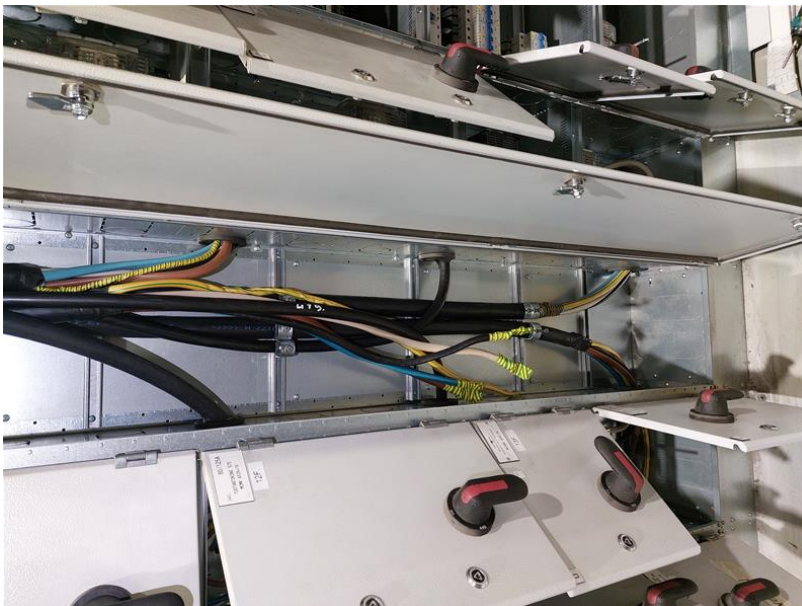

17230099470318503313815773130377.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet


Kuvaus 5F, 6F, 7F kaapeli kytkettynä, sulakkeet poistettu, kannessa dymomerkintä: ei saa kytkeä poistettu käytöstä, onko kentänpää turvallistettu?, selvitys.



17229455651678891123513148271158.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Kuvat puuttuu, keskusmerkinnät päivitettävä.

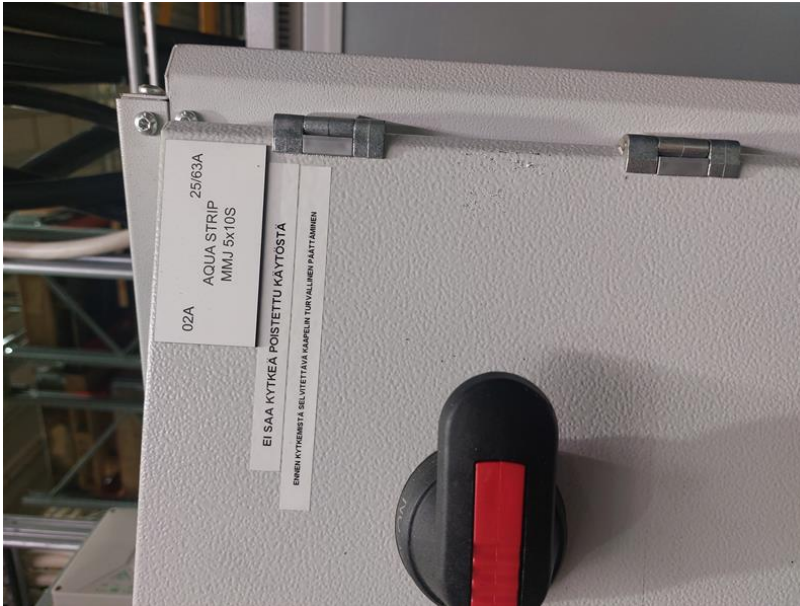


172294522749934384833514095399.jpg



17229452605583297371735385022019.jpg

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus Syöttävän keskuksen tunnuskilpi odottaa pkt01 kaapissa asennusta.

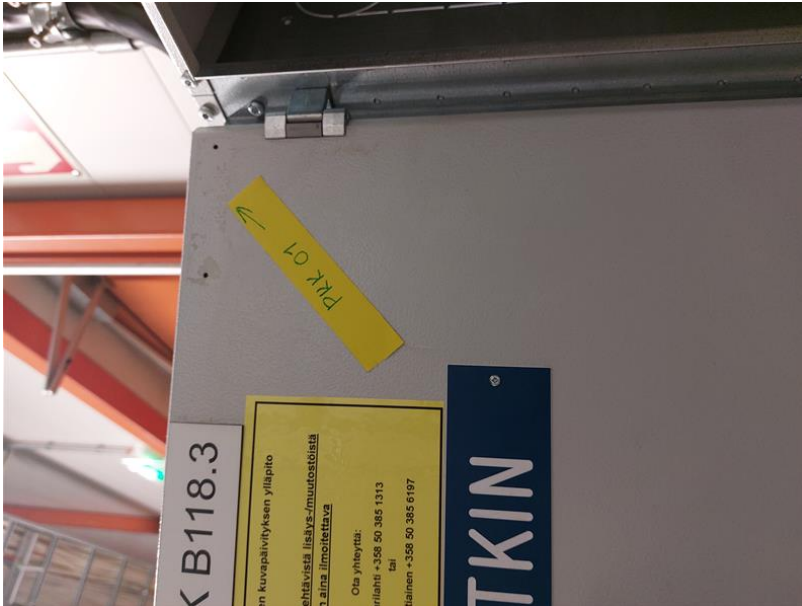

17234566088966333738524163930095.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus Syöttävän keskuksen kilpi odottaa asennusta PKT02 keskustilan kaapissa.

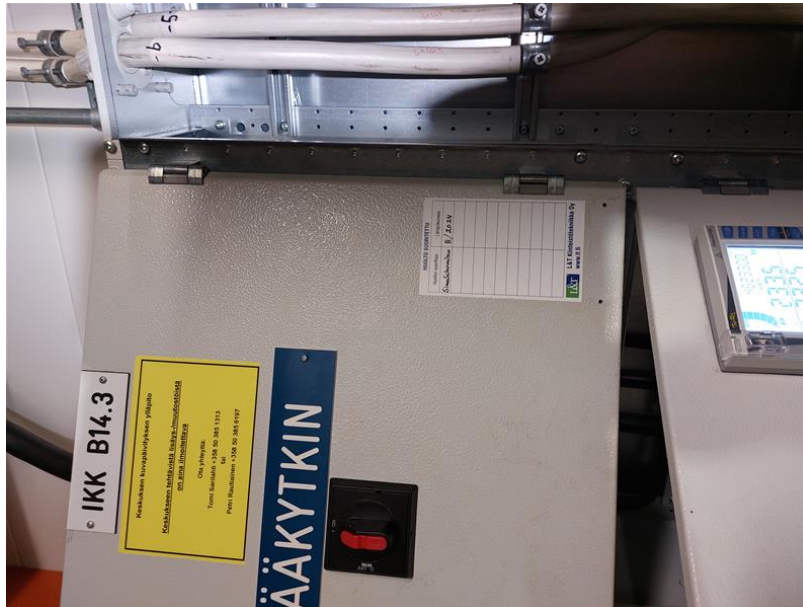

17234624237827983903766308200912.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet


Kuvaus *Hiipuneet/palaneet Led-kontrollimerkkivalot 58H1, 61H1, 63H1 ja 63H1 uusittava.*



17235381862058516323813938305257.jpg

Kohta 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kuvaus 5F-31F kytkentätilassa irtojohtimia, johtimien päättäminen.

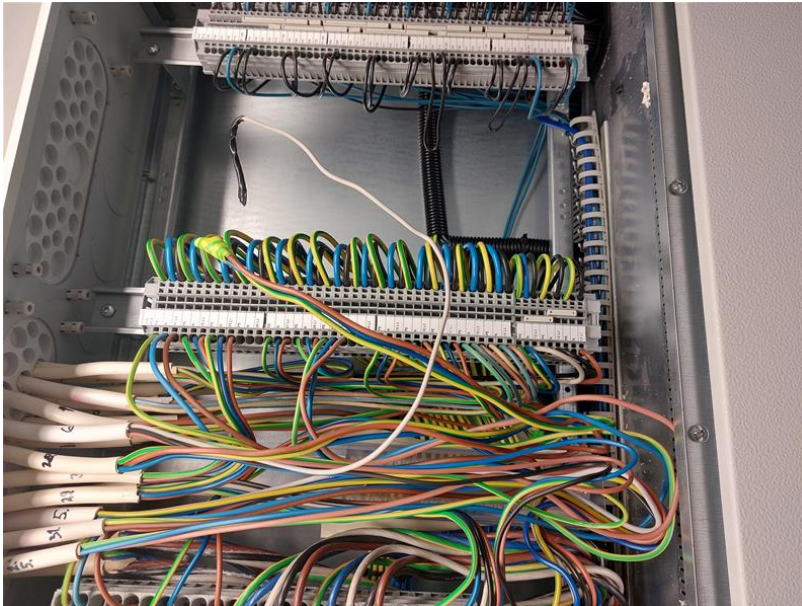

17235401540272385126388298811354.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus Syöttävän keskuksen kilpi odottaa asennusta pkt02 keskustilan kaapissa.



17234594160417115063042229600149.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Kaapelikuilussa Irtonousukaapeli päät teipattuna, rasioitava keskuksen ulkopuolelle, onko toinen pää turvallistettu?*



17229214443311966095353367660671.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake NK ja IKK 1/3

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 00:00:00

13.8.2024 15:26

Kohta 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus Sulakekaappi lojuu irrallaan lattialla kiinnitystilan puutteen vuoksi, sulakekaapin kiinnitys sopivaan paikkaan.



17229217929227749624045426143530.jpg

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus Keskuksen päällipuoli rasvapölyinen, roiskeita, imurointi/pyyhintä esim. Powerwipes liinoilla.



17229223175385201757920692769440.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Kaksi pääkaaviota joista kumpikaan ei vastaa nykytilannetta, pääkaavio päivitys tehtävä. 8F sulakkeet poistettu, kahva Off asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne kentänpäässä?*



17230137347558038363097552981383.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus Kaapelikuilun kaapelien rakennusaikaiset nippusidekiinnitykset muutettava kaarikiinnikeiksi.



17230139094279103830899866773962.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus Verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt ja luettavissa vain vinosta kulmasta.




17234429443414506731120627131899.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 5F sulakkeet poistettu, kahvassa roikkuva lukko ei lukitse kahvaa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne? 16F sulakkeet poistettu, kaapeli kytkettynä, onko kentänpää turvallistettu? 18F lukittu Off asentoon, sulakkeet paikoillaan, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?



17234424712555906973839398716613.jpg

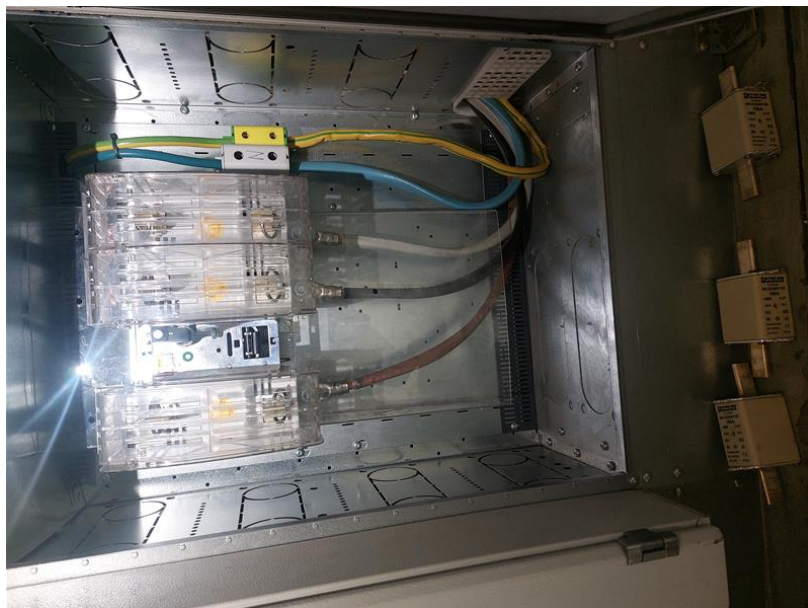

17234418875422502767226751426856.jpg



17234418473213181574089594265986.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Kaapelikuiluissa, kaapeleiden työaikaisten nippuside kiinnityksien vaihto kaarikiinnikkeiksi, n.45kpl.*



17234410583501978341997675039354.jpg

Kohta 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kuvaus *Irtokaapelinpää kaapelikennkineen päätetty jakorasiaan kennossa, turha kaapeli siirrettävä ja rasioitava keskuksen ulkopuolelle.*



17234413575252750377308592089749.jpg
